


PLANNING PREVISIONNEL SOUS SOL ET BOUCLE GEOTHERMALE - NOUVEAU DOUBLET AU LUSITANIEN CHATENAY-MALABRY

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur
0	Projet Chatenay-Malabry - ZAC La Vallée	656 jours	Lun 01/07/19	Lun 03/01/22	
1	1 ETUDES SOUS-SOL	459 jours	Jeu 01/08/19	Mar 04/05/21	
2	1.1 APD	20 jours	Lun 19/08/19	Ven 13/09/19	
3	1.2 PRO	20 jours	Lun 04/11/19	Ven 29/11/19	
7	1.3 PER DOTEX	307 jours	Lun 02/03/20	Mar 04/05/21	
8	1.3.1 Constitution des dossiers PER et DOTEX	67 jours	Jeu 01/08/19	Ven 01/11/19	
9	1.3.2 Dépôt dossier PER-DOTEX en préfecture	0 jour	Lun 02/03/20	Lun 02/03/20	8
10	1.3.3 Instructions Préfecture et DRIEE	90 jours	Lun 02/03/20	Ven 03/07/20	9
11	1.3.4 Désignation commissaire enquêteur et préparation enquête publique	5 jours	Lun 06/07/20	Ven 10/07/20	10
12	1.3.5 Enquête publique	25 jours	Lun 13/07/20	Ven 14/08/20	11
13	1.3.6 Réponses commissaire enquêteur et envoi rapport au préfet	25 jours	Lun 17/08/20	Ven 18/09/20	12
14	1.3.7 Instruction du dossier complet par DRIEE et Autorité environnementale	45 jours	Lun 21/09/20	Ven 20/11/20	13
15	1.3.8 CODERST	25 jours	Lun 23/11/20	Ven 25/12/20	14
16	1.3.9 Rédaction et signature de l'arrêté préfectoral et autorisation	25 jours	Lun 28/12/20	Ven 29/01/21	15
17	1.3.10 Autorisation -Arrêté recherche et d'ouverture de travaux (PER-DOTEX)	0 jour	Ven 29/01/21	Ven 29/01/21	16
18	2 ETUDES SURFACE	180 jours	Lun 01/07/19	Ven 06/03/20	
19	2.1 Etude réseaux APD	55 jours	Mer 17/07/19	Mar 01/10/19	
20	2.2 Etude techniques géothermie Primaire/secondaire	180 jours	Lun 01/07/19	Ven 06/03/20	
21	3 DOSSIER TITRE V	267 jours	Jeu 31/10/19	Ven 06/11/20	
27	4 DOSSIER CHAUFFERIE CENTRALISEE	172 jours	Jeu 02/01/20	Ven 28/08/20	
28	4.1 Validation de l'APD Chauffage	0 jour	Jeu 02/01/20	Jeu 02/01/20	27
29	4.2 Dépôt du dossier de déclaration 2910A ICPE	0 jour	Ven 31/01/20	Ven 31/01/20	28
30	4.3 Dépôt du Permis construire	0 jour	Lun 03/02/20	Lun 03/02/20	29
31	4.4 Obtention du permis de construire Chauffage	0 jour	Ven 28/08/20	Ven 28/08/20	30
32	5 MARCHÉ FORAGE et TRAVAUX	366 jours	Mer 18/03/20	Mer 11/08/21	
33	5.1 ACT	86 jours	Lun 06/07/20	Lun 02/11/20	
39	5.2 VISA	6 jours	Lun 02/11/20	Lun 09/11/20	
42	5.3 DET	361 jours	Mer 18/03/20	Mer 04/08/21	
43	5.3.1 Approvisionnement Tubes/casing	110 jours	Mar 03/11/20	Lun 05/04/21	42
44	5.3.2 Aménagement terrain/plate-forme et viabilisation	120 jours	Mer 18/03/20	Mar 01/09/20	42
45	5.3.3 Réalisation deux avant-puits	25 jours	Lun 01/02/21	Ven 05/03/21	44
46	5.3.4 Mise en place du chantier et machine	8 jours	Mar 06/04/21	Jeu 15/04/21	45
47	5.3.5 Travaux forage producteur (y compris essais)	23 jours	Ven 16/04/21	Mar 18/05/21	46
48	5.3.6 Ripage de la machine	5 jours	Mer 19/05/21	Mar 25/05/21	47
49	5.3.7 Travaux forage injecteur (y compris essais)	23 jours	Mer 26/05/21	Ven 25/06/21	48
50	5.3.8 Repli machine	8 jours	Lun 28/06/21	Mer 07/07/21	49
51	5.3.9 Remise en état du site	20 jours	Jeu 08/07/21	Mer 04/08/21	50
52	5.4 AOR Réception	5 jours	Jeu 05/08/21	Mer 11/08/21	51
53	5.4.1 Réception des Puits	5 jours	Jeu 05/08/21	Mer 11/08/21	52
54	5.5 DOE	48 jours	Jeu 27/05/21	Lun 02/08/21	
55	5.5.1 Rédaction DOE Producteur	20 jours	Jeu 27/05/21	Mer 23/06/21	54
56	5.5.2 Rédaction DOE Injecteur	20 jours	Mar 06/07/21	Lun 02/08/21	54
57	6 DEMANDE PEX	100 jours	Mar 10/08/21	Lun 27/12/21	
58	6.1 Constitution du dossier de permis d'exploiter (PEX)	30 jours	Mar 10/08/21	Lun 20/09/21	57
59	6.2 Instruction du dossier en préfecture/DRIEE	70 jours	Mar 21/09/21	Lun 27/12/21	58
60	6.3 Autorisation - Permis d'exploitation (PEX)	0 jour	Lun 27/12/21	Lun 27/12/21	59
61	7 TRAVAUX SURFACE CENTRALE	198 jours	Ven 26/03/21	Mer 29/12/21	
62	7.1 Mise à disposition du bâtiment chaufferie centralisée	0 jour	Ven 26/03/21	Ven 26/03/21	61
63	7.2 Travaux surface canalisations	75 jours	Mer 31/03/21	Mar 13/07/21	62
64	7.3 Travaux électrique et automatisation (process production)	90 jours	Mer 14/07/21	Mar 16/11/21	63
65	7.4 Essai chaufferie (réglages et automatisation)	10 jours	Mer 17/11/21	Mar 30/11/21	64
66	7.5 Descente des équipements de puits (pompe)	10 jours	Mer 01/12/21	Mar 14/12/21	65
67	7.6 Essai de boucle (réglages et automatisation)	10 jours	Mer 15/12/21	Mar 28/12/21	66
68	7.7 PV de réception définitive chaufferie	1 jour	Mer 29/12/21	Mer 29/12/21	67
69	8 MISE EN SERVICE DU DOUBLET	0 jour	Lun 03/01/22	Lun 03/01/22	
70	8.1 Mise en service doublet Lusitanien	0 jour	Lun 03/01/22	Lun 03/01/22	69

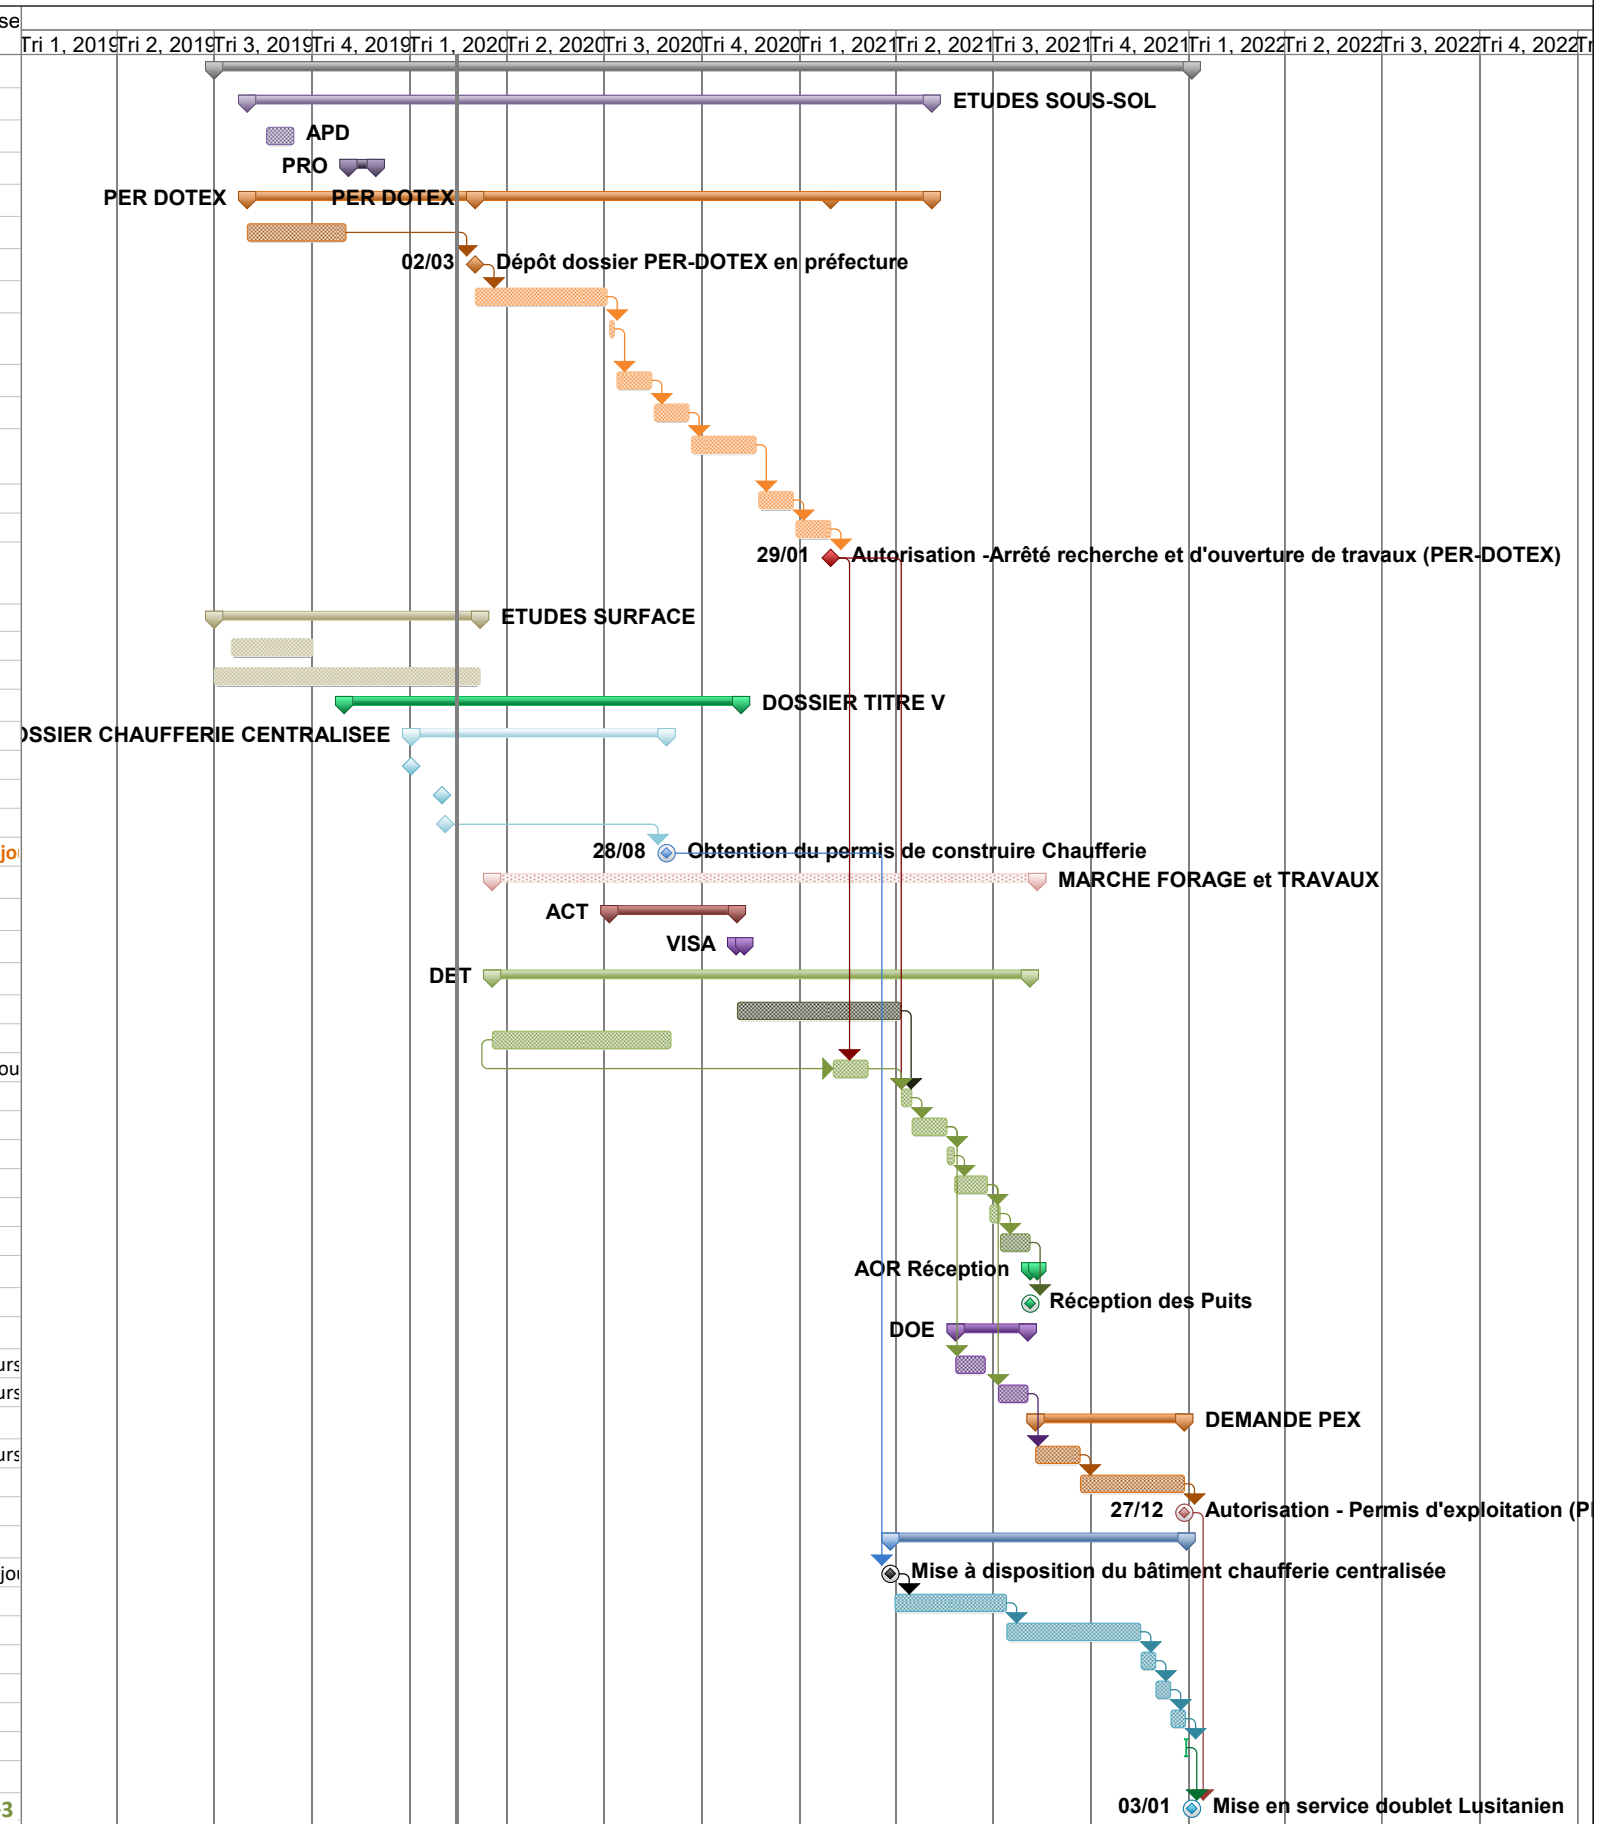

Projet : CHATENAY MALABRY
 Date et auteur : OCTOBRE 2019 /AL
 Affaire: TUC 18156

Tâche		Récapitulative de projet		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Fractionnement		Fractionnement		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalon	
Jalon		Avancement		Tâche manuelle		Début uniquement			
Récapitulative		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement			
